Natürlich voller Energie.

# Status Breitbandausbau Dithmarschen

November 2019

SWN
Stadtwerke Neumünster

# Ausbaustatus graphische Darstellung




Gebiet mit aktiven Kunden

Gebiet im Bau

Vermarktung läuft

Erfolgreich vermarktet

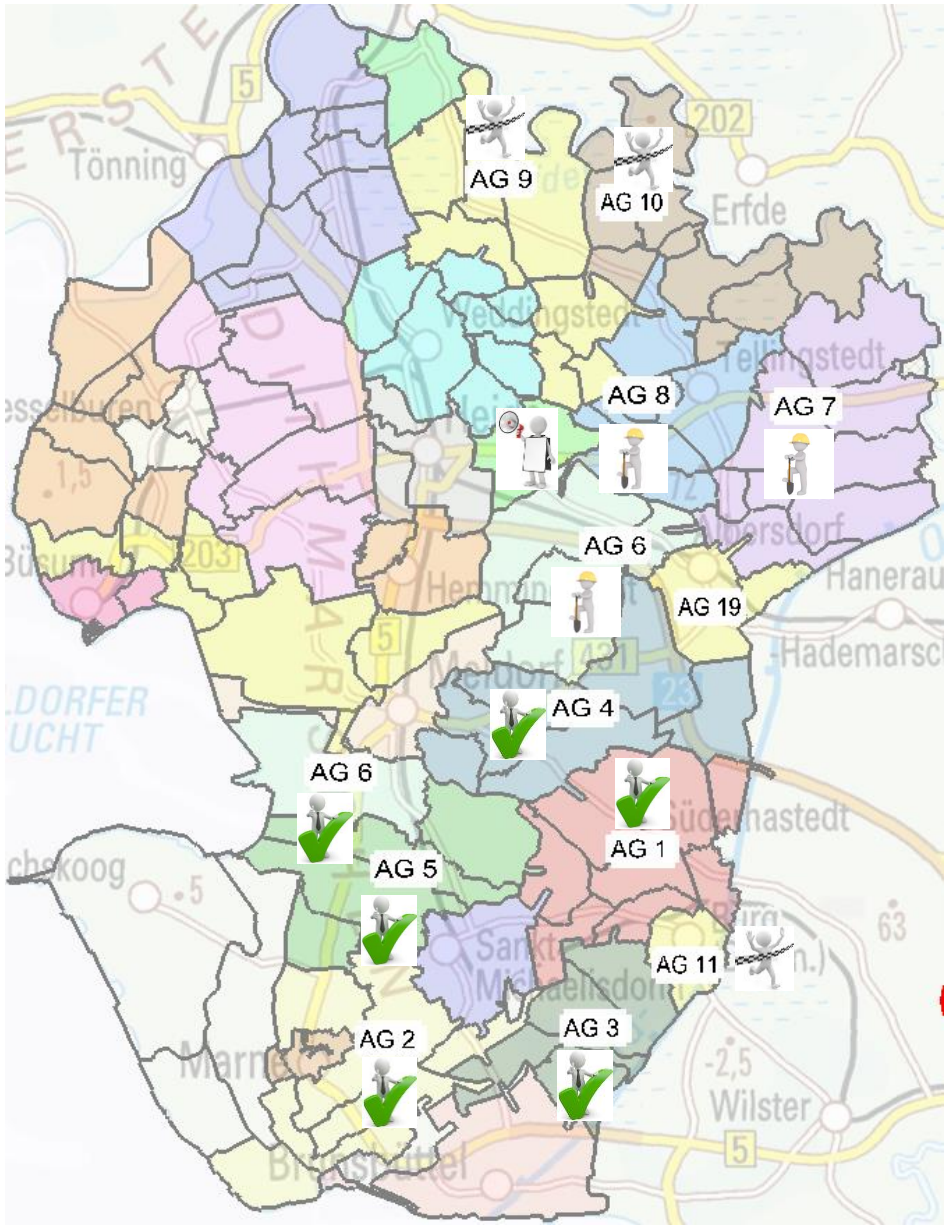

SWN
Stadtwerke Neumünster

# Vermarktungs plan 2020




Gebiet mit aktiven Kunden

Gebiet im Bau

Vermarktung läuft

Erfolgreich vermarktet

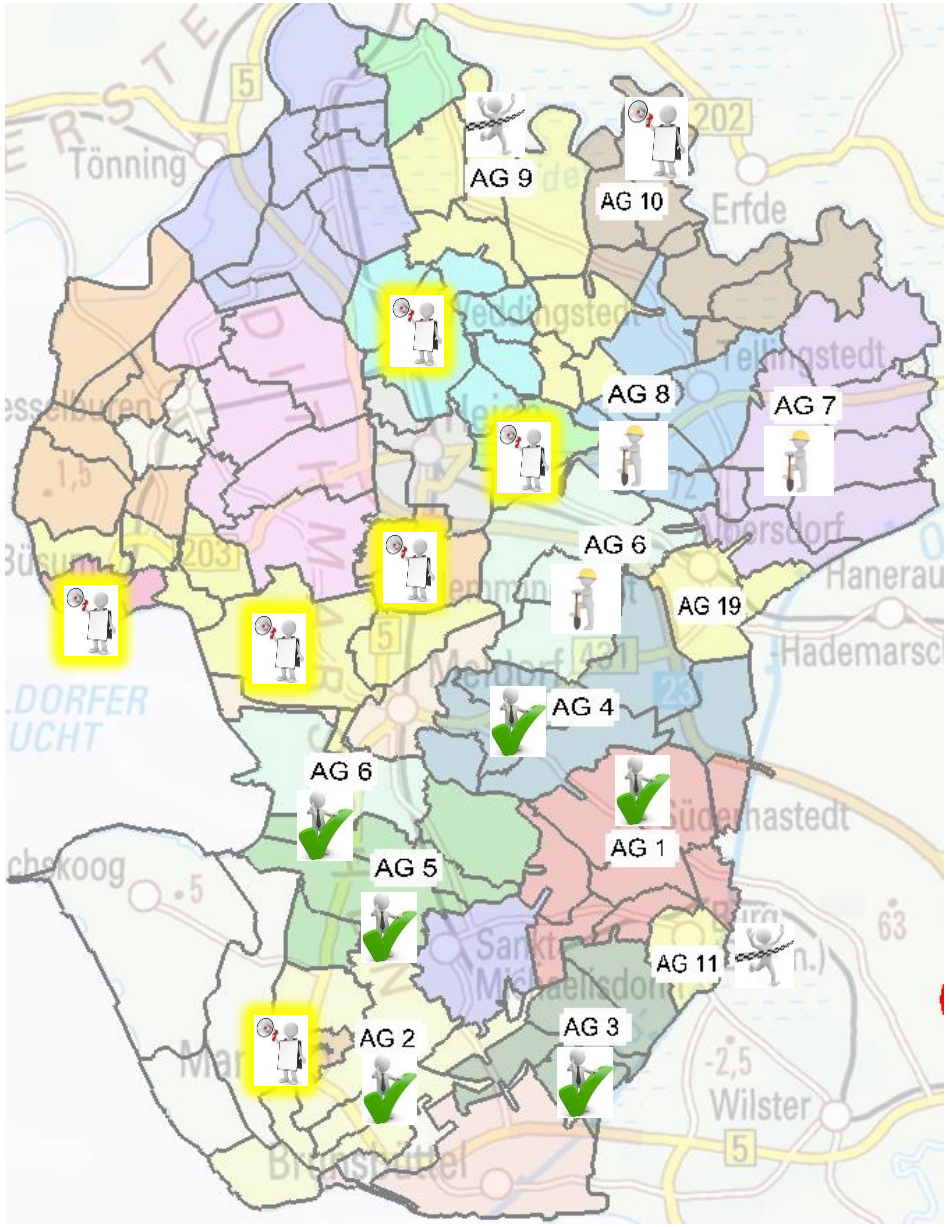Vermarktung geplant



Natürlich voller Energie.
SWN Stadtwerke Neumünster

# Kunden-Status

| | **Oktober 2019** | Oktober 2018 | Ziel Projekt-ende |
|---|---|---|---|
| Kundenverträge | **8.291** | 5.752 | 22.700 |
| Betriebsfertige Hausanschlüsse | **4.624** | 2.989 | 19.700 |
| Aktive Kunden am Netz (portiert) | **4.510** | 2.665 | 22.700 |
| Trassenkilometer | **372 km** | 268 km | 1.110 km |

# Ausbau – Status

Natürlich voller Energie.

- AG 1 ✓ Nutzungsübergang Januar 2017
- AG 2 ✓ Nutzungsübergang Januar 2019
- AG 3 ✓ Nutzungsübergang Januar 2019
- AG 4 ✓ Nutzungsübergang Januar 2020
- AG 5 ✓ Nutzungsübergang Januar 2020
- AG 6 > Tiefbaustart Mai 2019 – geplantes Ende Jan. 2020
- AG 7 > Tiefbaustart Sep. 2019 – geplantes Ende Juni 2020
- AG 8 > Tiefbaustart Nov. 2019 – geplantes Ende August 2020
- AG 9 > Tiefbaustart Frühjahr 2020

**Ziel > Ausbau Dithmarschen gesamt fertig Vermarktung 2023 / Ausbau 2024**



SWN Stadtwerke Neumünster

# Gehwegsanierungen durch die Gemeinden

| |
|---|
| Bargenstedt |
| Buchholz |
| Busenwurth |
| Eddelak |
| Krumstedt |
| Kuden |
| Marne |
| Meldorf |
| Nindorf |
| Nordhastedt |
| Offenbüttel |
| Sarzbüttel |
| Schafstedt |
| Trennewurth |
| Wolmersdorf |

Internet · Telefonieren · Fernsehen ...

Breitband

Zweckverband Dithmarschen

# Mitverlegungen in neuen Baugebieten

| |
|---|
| Buchholz |
| Burg |
| Büsum |
| Dellstedt |
| Elpersbüttel |
| Hennstedt |
| Krumstedt |
| Kuden |
| Meldorf |
| Nindorf |
| Nordhastedt |
| Ramhusen |
| Schafstedt |
| Tellingstedt |

Internet · Telefonieren · Fernsehen ...

Breitband

Zweckverband Dithmarschen
